

工事全体スケジュール

※工事の進捗によりスケジュール等は変更する場合があります。

■ 工事	令和7年			令和8年									令和9年									令和10年				
	令和7年度			令和8年度									令和9年度									令和10年度				
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
				STEP 1 仮設校舎建設			STEP 2 既存校舎解体			STEP 3 新校舎建設									STEP 4 仮設校舎解体 管理棟改修・外構							

STEP 1 仮設校舎建設

グラウンドに仮設校舎を建設し、教室棟 2 と渡り廊下で接続します。また、受水槽の移設や支障となる樹木の伐採等を行います。

STEP 2 既存校舎解体





教室棟 1 の解体工事を行います。
(騒音等の発生を想定し、夏休みに工事期間を組み入れております)

STEP 3 新校舎建設

教室棟 1 の跡地に新校舎を建設します。

STEP 4 仮設校舎解体・管理棟改修・外構

仮設校舎等の解体工事及び管理教室棟の改修工事、グラウンドの整地を含めた外構工事等を行います。

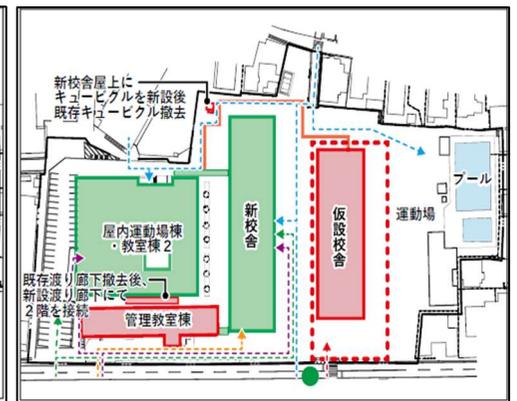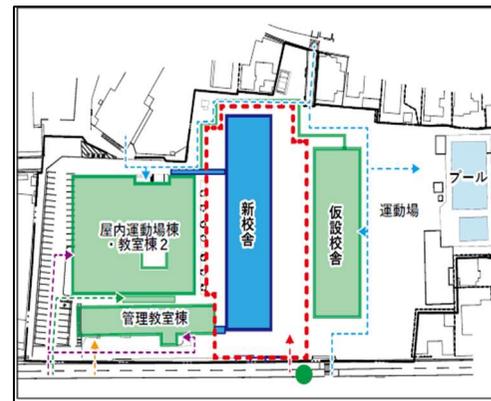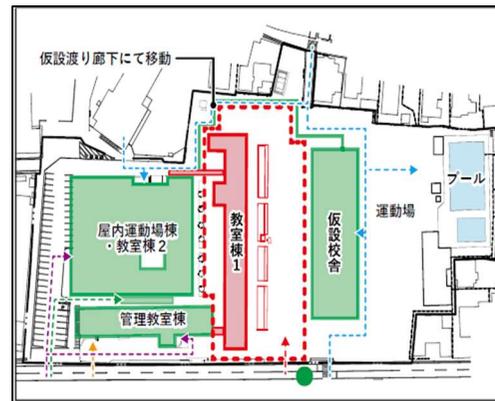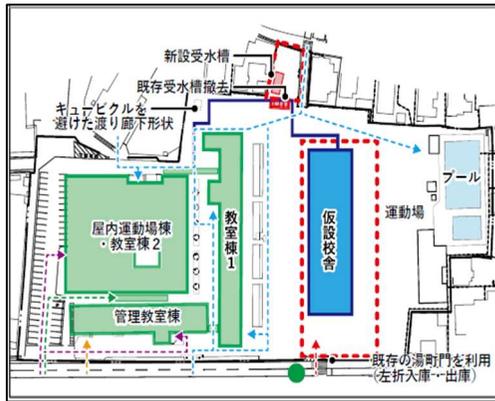

【凡例】

← 児童動線

← 教職員動線

← 来校者動線

← 給食搬入動線

← 工事動線

■ 利用可能建物

■ 新設・整備

■ 解体・撤去・改修

■ 仮囲い

● 交通誘導員
