

二日市東小学校校舎改修だより



Vol.2 令和7年12月1日




工事の進捗状況

【現在の状況】

二日市東小学校では、令和7年7月7日より、増築及び長寿命化改良工事を実施しています。

当初のスケジュール通り、工事は順調に実施しており、現在の工事の進捗状況は右のとおりです。



- ◆管理棟増築工事の時に職員室等として使用する仮設棟の建設が完了しました。
- ◆グラウンドの北門側に工事現場事務所の建設が完了しました。
- ◆増築棟建設時に支障となる、旧飼育小屋・倉庫・樹木などの撤去を行っています。

日直
つくし

- ・仮設棟は、管理棟の西側（正門側）に建設され、管理棟正面玄関と接続しています。
- ・管理棟拡幅の工事終了まで、職員室は仮設棟へ移動します。詳細は次項へ記載しています。



今後の工事(令和7年12月～)

今後の工事予定

令和7年11月～令和9年2月

【令和7年12月～】

- ・管理棟をグラウンド側に拡幅する、増築工事を行っています…①
 - ・増築棟の新築工事を行います。…②
- 増築棟は4階建てとなっており、1階～3階は管理棟と接続します。

工事の期間は工事車両の出入りを北門より行います。交通誘導等の安全管理を徹底いたします。ご理解ご協力をお願いいたします。

安全に作業いたします



今回の工事期間では、増築棟(管理棟北側)・管理棟周辺、また教職員の駐車場として、教室棟1のグラウンド側にも工事囲い・フェンス等を設置しています。グラウンドの使用範囲の制限等ご迷惑をお掛けいたします。

また、工事により発生する騒音等の影響も学校生活に影響が少なくなるよう対策等を徹底し、作業を行います。

校舎完成後イメージ






管理棟諸室が移動しました

管理棟の増築工事に伴い、11月4日(火)より職員室が仮設棟へ移動しています。

(※事務室、校長室の場所は変わりません)

保健室等も、11月18日(火)より既存の管理棟内で場所が変更となっています。

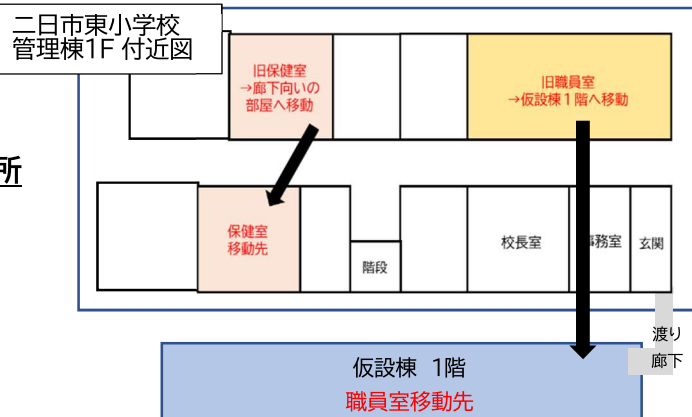

工事中の安全対策・騒音振動対策(写真)

安全対策・騒音対策等を行い、引き続き安全に工事を実施します。



工事囲い・ネット・バリケードなどを設置しています



防音シート設置



騒音振動測定器の設置



低騒音型建設機械

超低騒音型のステッカー
(ハイブリット型バックホウ)



騒音対策を行い、工事・作業を実施します。



保護者のみなさま・地域のみなさまへ

学校運営や近隣の皆様への影響を考え、登校時間帯の通行を一部制限、交通誘導員の配置・誘導のもと交通安全に配慮しています。また、騒音対策等の周辺環境の確保にも努めています。

今後は本格的に管理棟の一部解体工事や増築棟の建設工事が始まることから、北門からの工事車両の出入りが発生します。より一層の安全確認を徹底し工事を実施していきます。

児童をはじめ関係者のみなさまにおかれましては、グラウンドの使用スペースの減少や移動の制限など、ご不便をおかけしておりますが、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

