



# 二日市小学校校舎増改築だより



発行：筑紫野市教育委員会 教育部教育政策課 廉務担当

Vol.2 令和7年12月19日

## 事業の進捗状況について

初回の増改築だから早4か月が経過し、今年も残すところあとわずかとなりました。


本事業において、昨年11月から開始している新校舎の設計作業も概ね固まりつつあり終盤を迎えていきます。

また、12月に入り敷地東側の受水槽移設及び関連工事(樹木の伐採や遊具の移設)を開始しています。

そして、令和8年1月13日からは仮設校舎新設工事が始まり、いよいよ工事の仮囲い等を設置し大がかりな工事に取り掛かります。今後の工事スケジュールは以下を予定しています。

## 仮設校舎新設工事について

R8年1月13日(火)より仮設校舎の新設工事(渡り廊下設置含む)を開始します。

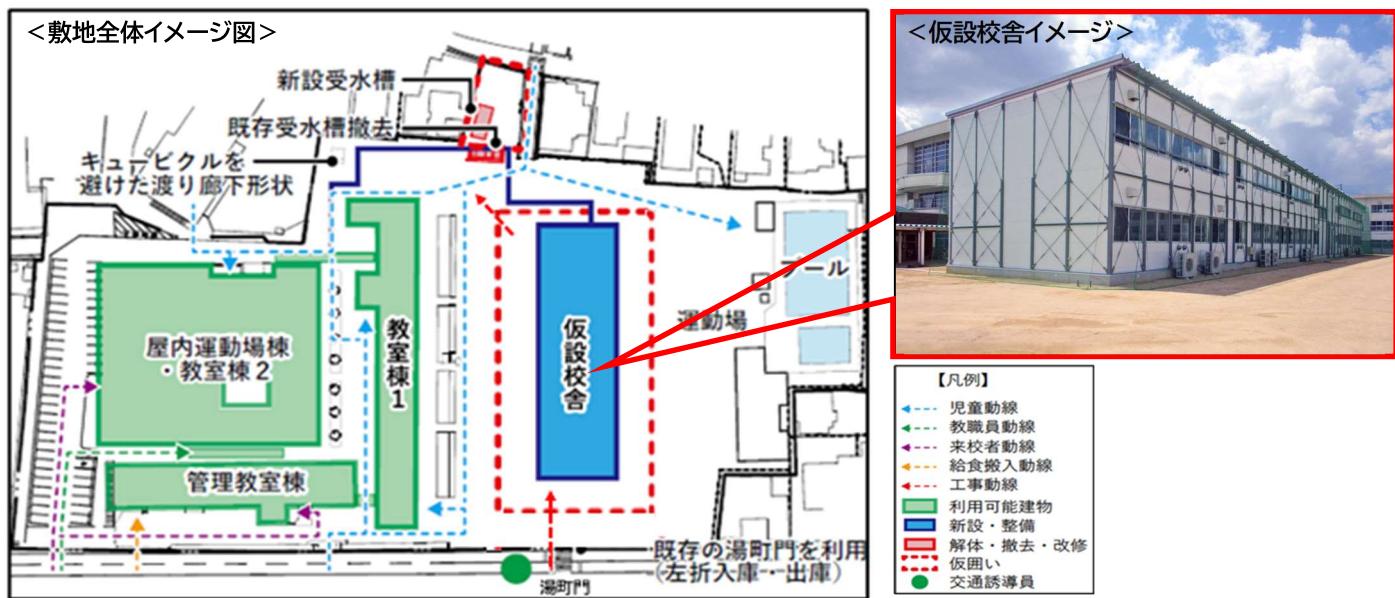

◇工期は約5か月間を予定しており、完成後、教室棟Iから仮設校舎への引越し作業を行います。

◇周りを仮囲い(下図:赤点線)するなど工事エリアを明確に区分し、安全に学校運営ができる計画とします。


◇工事車両の出入りゲートとなる湯町門については、交通誘導員を配置します。また、学校利用者動線と工事動線を区分して歩車分離の徹底を行い、安全性を最優先に考えた工事計画とします。

◇工事作業時間:原則午前8時30分から午後5時30分まで、日曜・祝日は作業を行いません。


## 仮設校舎配置図について



【 1F 】

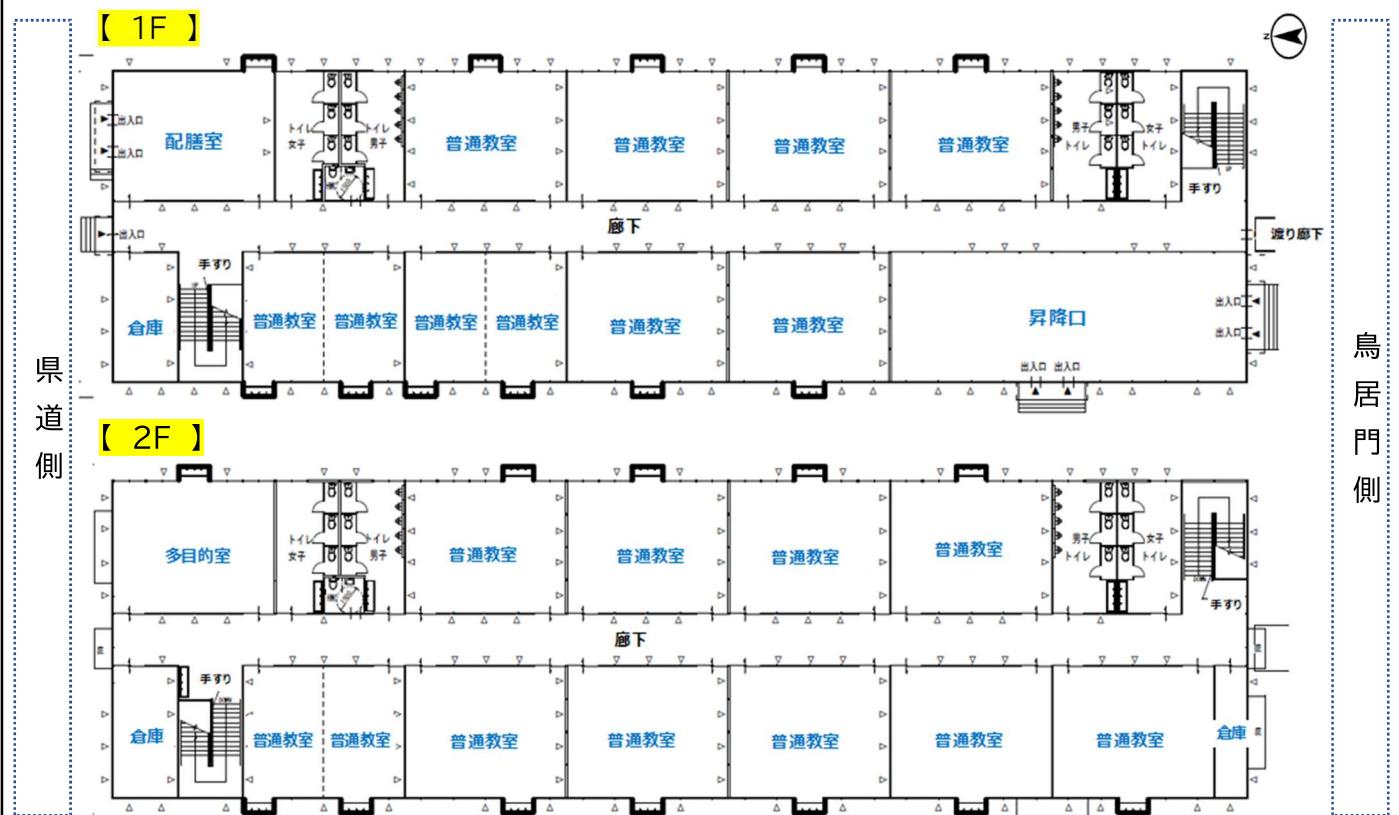

【 2F 】

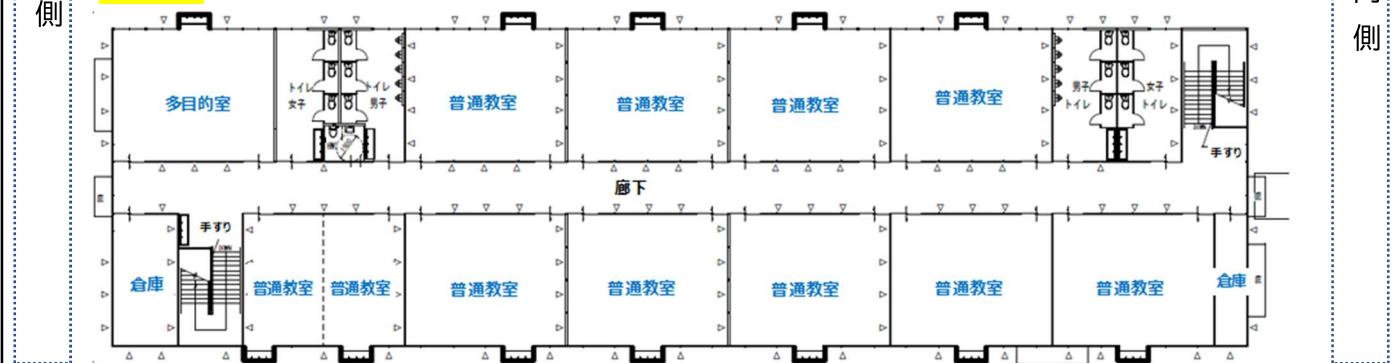

◇ 軽量鉄骨造2階建てのプレハブ校舎。普通教室 21 教室、1F に配膳室、2F に多目的室、また各階に倉庫、男女トイレ及び多目的トイレを配置します。

◇ 普通教室、多目的室、配膳室については冷暖房設備、換気設備及び手洗いシンクを設置します。

## クスノキプロジェクトについて



工事の支障となり伐採する校舎東側の樹木(クスノキ他)について新校舎への再活用を計画しており、どういったものに活用してほしいか児童の皆さんへ意見を募りました。


R7年12月12日(金)、学校を代表して運営委員会の児童6名から、上野教育長に提案書が渡されました。

提案内容は「ベンチ、クラス札、学校名を彫った木の看板」でした。



貴重なご意見有難うございました。

長年二日市小で大切にされてきた樹木、カタチにできるよう努力して参ります。



これから本格的な工事を開始するにあたり、グラウンドの使用制限や移動制限、また騒音の発生など、児童・保護者の皆さん、また近隣住民の皆さんには大変なご不便・ご迷惑をおかけいたします。  
関係者の皆様の安全第一を最優先に工事を進めて参ります。  
今後とも、本事業へのご理解・ご協力をよろしくお願ひいたします。

