



二日市小学校校舍増改築事業 保護者説明会

筑紫野市 教育委員会
教育政策課



説明内容

- 1) 二日市小学校の現状・課題
- 2) 施設整備方針
- 3) 計画概要
- 4) スケジュール・工事工程
- 5) その他

1) 二日市小学校の現状・課題

①校舎の老朽化

- 教室棟1は建築後60年以上経過し、老朽化が進んでいる状況。

[全体の航空写真]



1) 二日市小学校の現状・課題

②教室数不足

- 校区内でマンション建設等により、児童全体の数が年々増加。
- 特別支援学級の在籍児童数も増加傾向。
- 35人学級制への移行の影響もあり、現時点で空き教室がない状況。
- 令和12年度には学級数のピークを迎え、教室不足が懸念される。

③放課後児童クラブの保育室不足

- 児童数増加に伴い、放課後児童クラブの入所希望人数も増加。

児童数・学級数・教職員数の推計（令和5年度基本計画策定時）

年度	区分	1年	2年	3年	4年	5年	6年	特別支援 学級	合計	教職員数 (人)
令和5年度	児童数（人）	161	146	103	127	129	125	36	827	46
	学級数	5	5	3	4	4	4	6	31	
令和6年度	児童数（人）	144	156	153	104	127	133	38	855	47
	学級数	5	5	5	3	4	4	6	32	
令和8年度	児童数（人）	173	146	144	164	154	107	41	929	51
	学級数	5	5	5	5	5	4	7	36	
令和10年度	児童数（人）	160	142	164	150	144	163	42	965	52
	学級数	5	5	5	5	5	5	7	37	
令和12年度	児童数（人）	165	185	160	147	164	155	43	1,019	54
	学級数	5	6	5	5	5	5	8	39	
令和15年度	児童数（人）	152	152	160	165	185	160	43	1,017	54
	学級数	5	5	5	5	6	5	8	39	

1) 二日市小学校の現状・課題

④駐車場不足

- 利用者(学校関係者及び来校者)の数に対して駐車場の台数が少ない。
- 児童数、放課後児童クラブ利用者数の増加により、保護者の送迎も増えている。
- 駐車場に十分なスペースがなく車両の離合が難しい状況にあり、時間帯によって混雑が発生している。



①～④の課題解決の為・・・


増改築事業の実施

2) 施設整備方針

事業概要

1. 校舎の老朽化、学級数の増加に対応するため、**教室棟1は改築(同位置に建替え)**、**管理教室棟については改修**を行う。
2. 放課後児童クラブの入所希望人数増加による保育室の不足への対応のため、校舎の改築・改修と合わせて、**小学校と放課後児童クラブの複合化**を図る。
3. 安全で利用しやすい駐車場とするため、管理教室棟西側に**駐車場を増設(15台分)**、一方通行型の送迎スペースを確保する。

〔施設整備の全体イメージ図〕

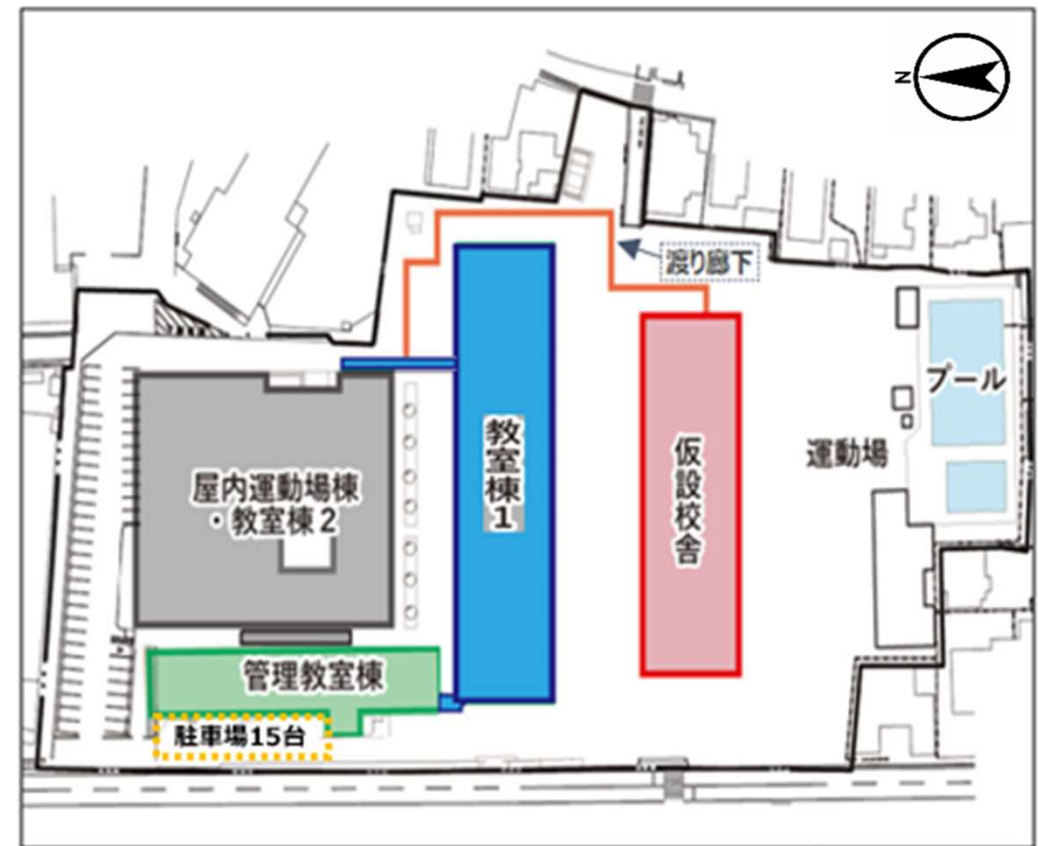

2) 施設整備方針

～施設整備における6つのテーマ～

- ① 筑紫野市の教育ビジョンの実現
- ② 将来的な学校運用を見据えた全体施設計画
- ③ 大規模校ならではの利用動線に配慮した施設づくり
- ④ 筑紫野市が有する今後の学校施設整備を見据えた学校づくり
- ⑤ 筑紫野の自然・歴史・文化を取り入れた学校づくり
- ⑥ 地域と共にある“しあわせ”な学校づくり

2) 施設整備方針

～施設整備における6つのテーマ～

① 筑紫野市の教育ビジョンの実現

- 多様な学習活動に対応できる仕様として、多連引戸による間仕切り、オープンスペース・少人数教室の配置による学年ユニットを構成する計画。
- 最先端のICT環境の整備。
(タブレット端末や電子黒板など)




■オープンスペースのイメージ

2) 施設整備方針

～施設整備における6つのテーマ～

② 将来的な学校運用を見据えた全体施設計画

- 児童数の変動に対応するため、多目的教室や少人数教室と教材室兼教師ステーションを普通教室へ転用できる設えとする計画。
- 築45年の管理教室棟の今後の整備計画(解体・改築)を見据え、既存の管理教室棟の諸室(職員室や保健室など)を新校舎に取り込み、円滑な学校運営に配慮。

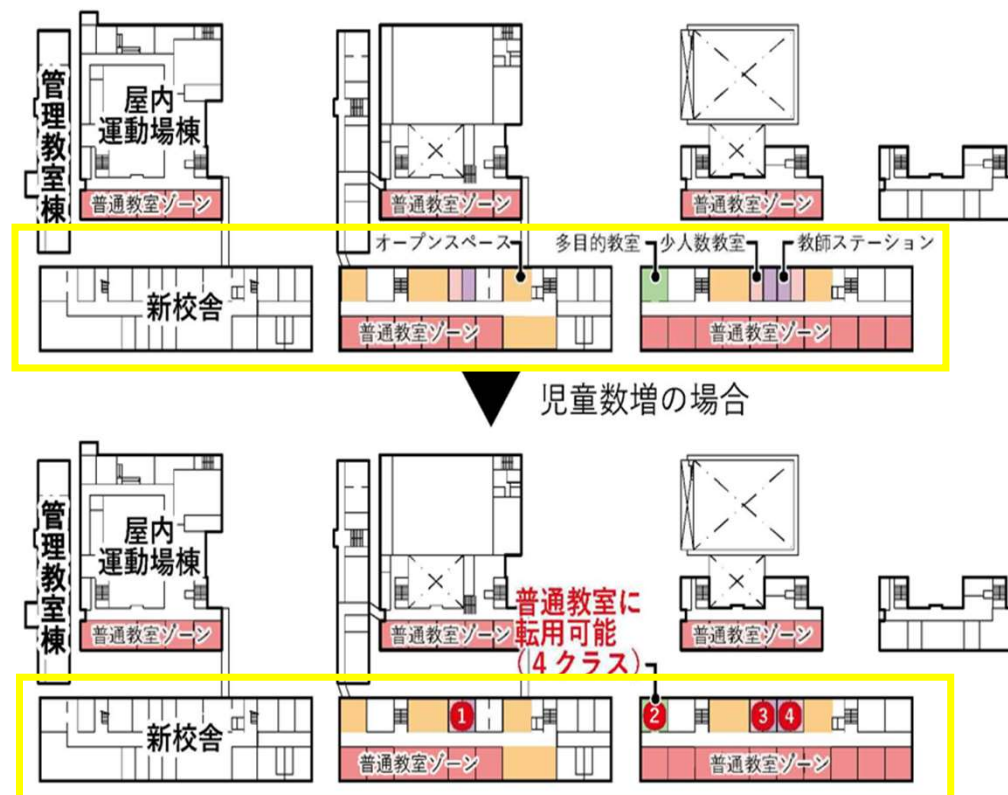


■児童数増の際の教室転用イメージ

2) 施設整備方針

～施設整備における6つのテーマ～

③ 大規模校ならではの利用動線に配慮した施設づくり

- 新校舎と既存校舎の1, 2階を屋外渡り廊下で接続することで、回遊動線を整備し、校舎間の移動がしやすい計画。
- 新設正門と鳥居門をつなぐメインアプローチを整備し、校舎へスムーズにアクセスできる計画。

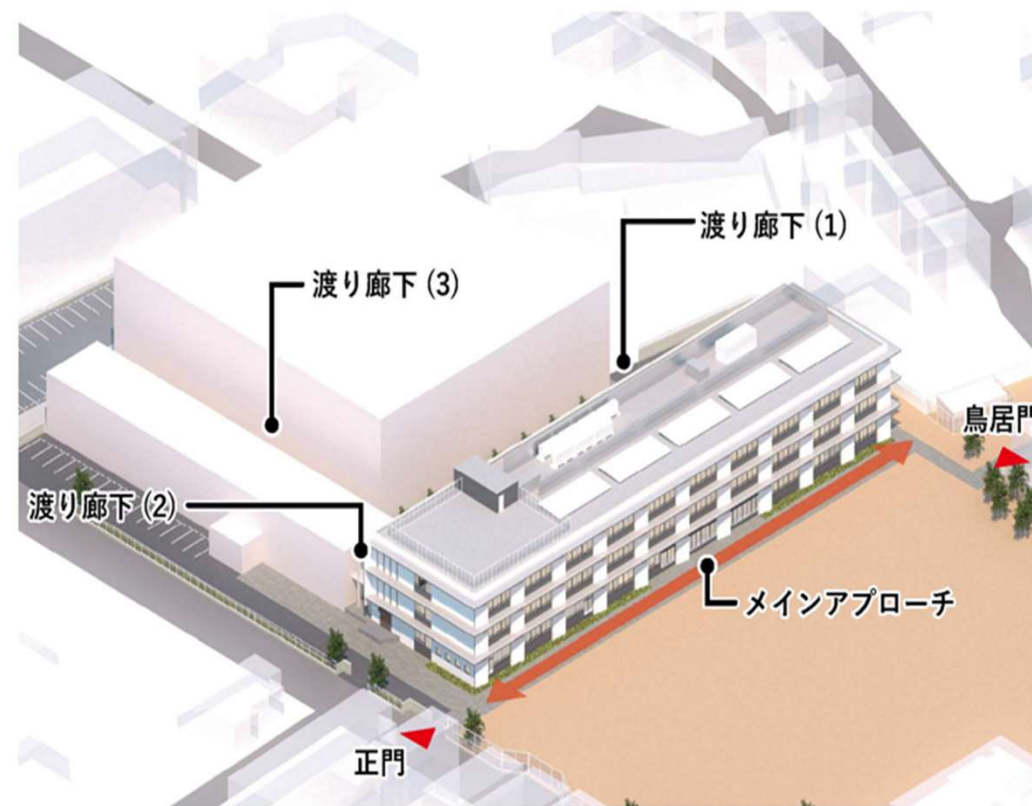


■回遊動線と駐車場・送迎スペース

2) 施設整備方針

～施設整備における6つのテーマ～

④ 筑紫野市が有する今後の学校施設整備を見据えた学校づくり

- コンパクトで整形な校舎形状とすることで建設コストを抑える。
 - 汎用性の高い建材の利用、メンテナンスに配慮した設計等によりランニングコストを最小限に抑える。
- ➡ 今後継続する他の学校施設整備のモデルとなる学校づくりへ。

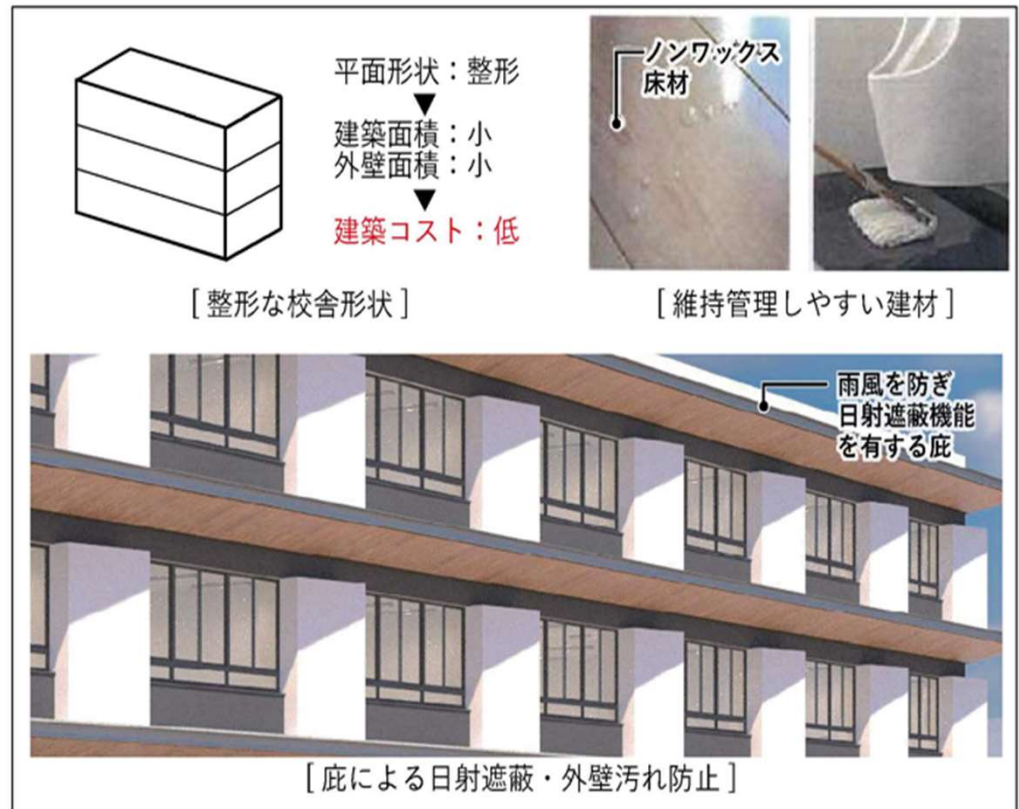


■ ライフサイクルコスト低減に配慮した設計イメージ

2) 施設整備方針

～施設整備における6つのテーマ～

⑤ 筑紫野の自然・歴史・文化を取り入れた学校づくり

- 内装の木質化や、筑紫野・二日市ならではの
内装計画やサインを設ける。
- 天拝山などの自然環境や、敷地内の樹木を活用し、筑紫野の歴史と文化に寄り添った学校づくりを行う。

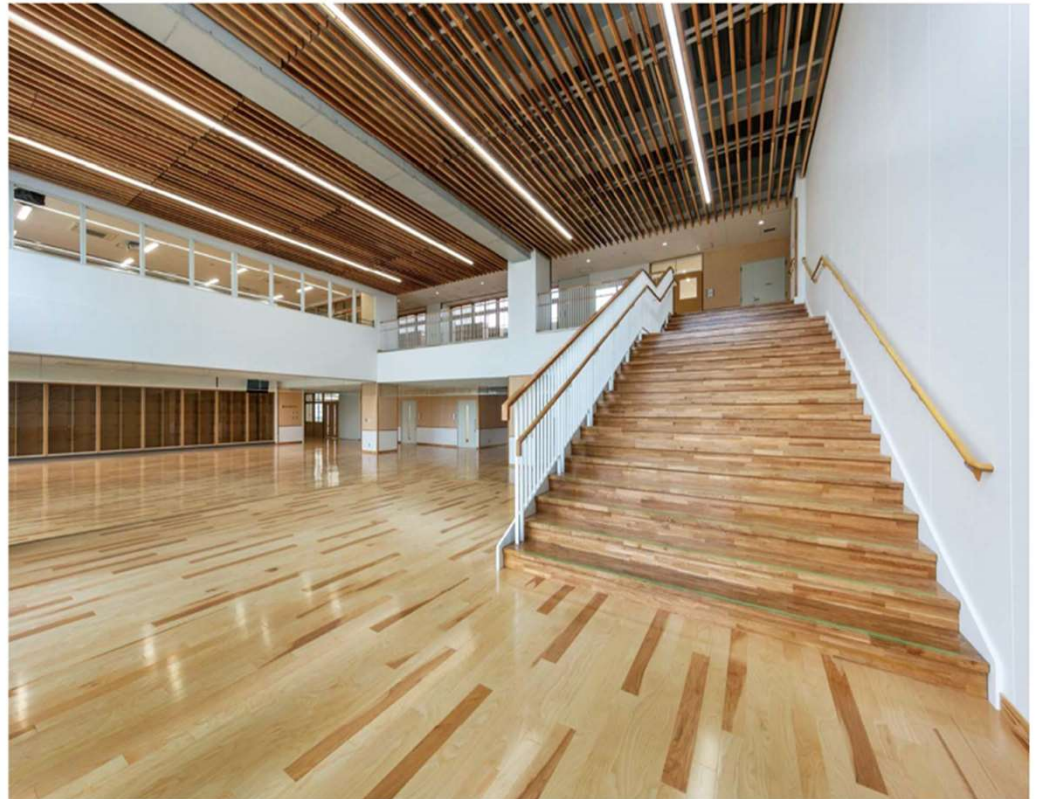


■木質化のイメージ

2) 施設整備方針

～施設整備における6つのテーマ～

⑥ 地域と共にある“しあわせ”な学校づくり

- 現在分散配置されている放課後児童クラブを管理教室棟に集約。
 - 駐車場増設及び送迎スペースを設けることで児童の送迎にも配慮した計画に。
- ➡ 保護者を支援する放課後児童クラブの実現を図る。

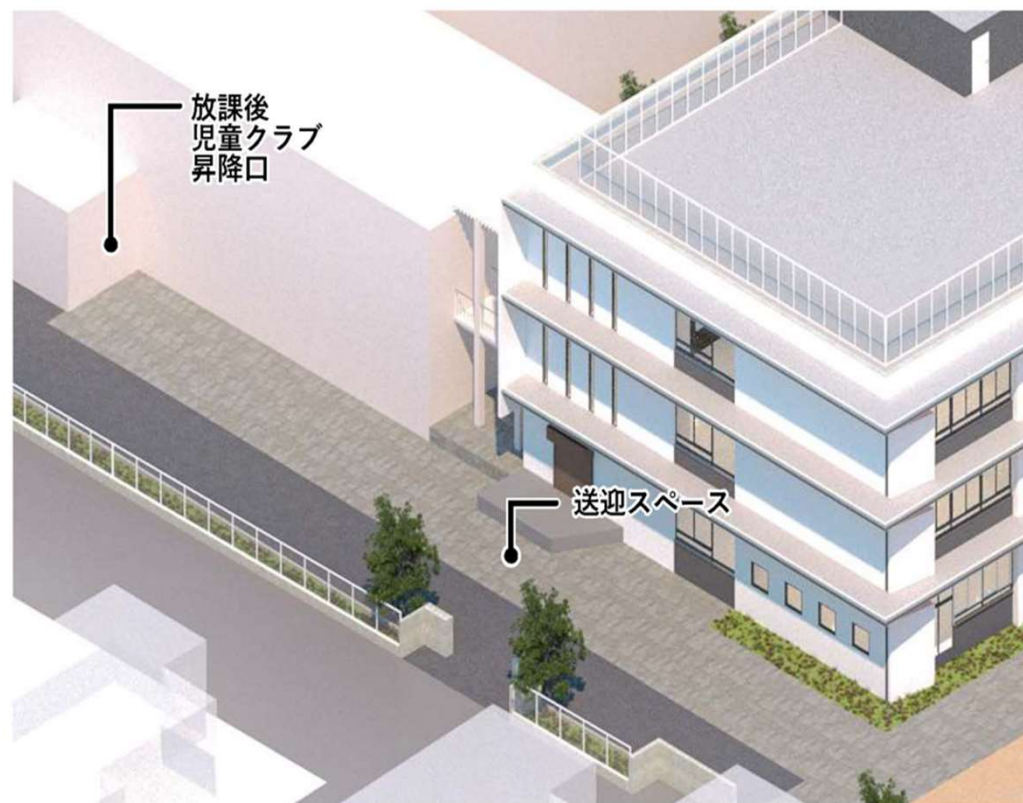

■放課後児童クラブ（管理教室棟）まわりのイメージ

3) 計画概要

建築概要

【新校舎棟】

主要用途：学校（小学校）

工事種別：新築（敷地内増築）

建築面積：1,748.39㎡

延床面積：4,948.77㎡

階数：3階建て

構造：RC造

建物高さ：13.05m




南西外観イメージ

3) 計画概要

平面計画 <1F>


- ① 西側に管理諸室をまとめ、教職員の円滑な執務従事を促す計画。
- ② 東側は特別支援学級ゾーンとし、保健室を近接させた配置とすることで見守りに配慮。
- ③ 管理教室棟1階は放課後児童クラブゾーンとし、人数に合わせた利用ができる保育室を配置。
- ④ 配膳室は新校舎・既存校舎への給食配膳を考慮した位置へ計画。
- ⑤ 正門や運動場が見渡せ、児童の見守りに配慮した職員室。
- ⑥ 中庭は屋外学習空間としてオープンスペースと連携利用可能。
- ⑦ 移動間仕切りとし、会議室・オープンスペースを一体的に利用可能。

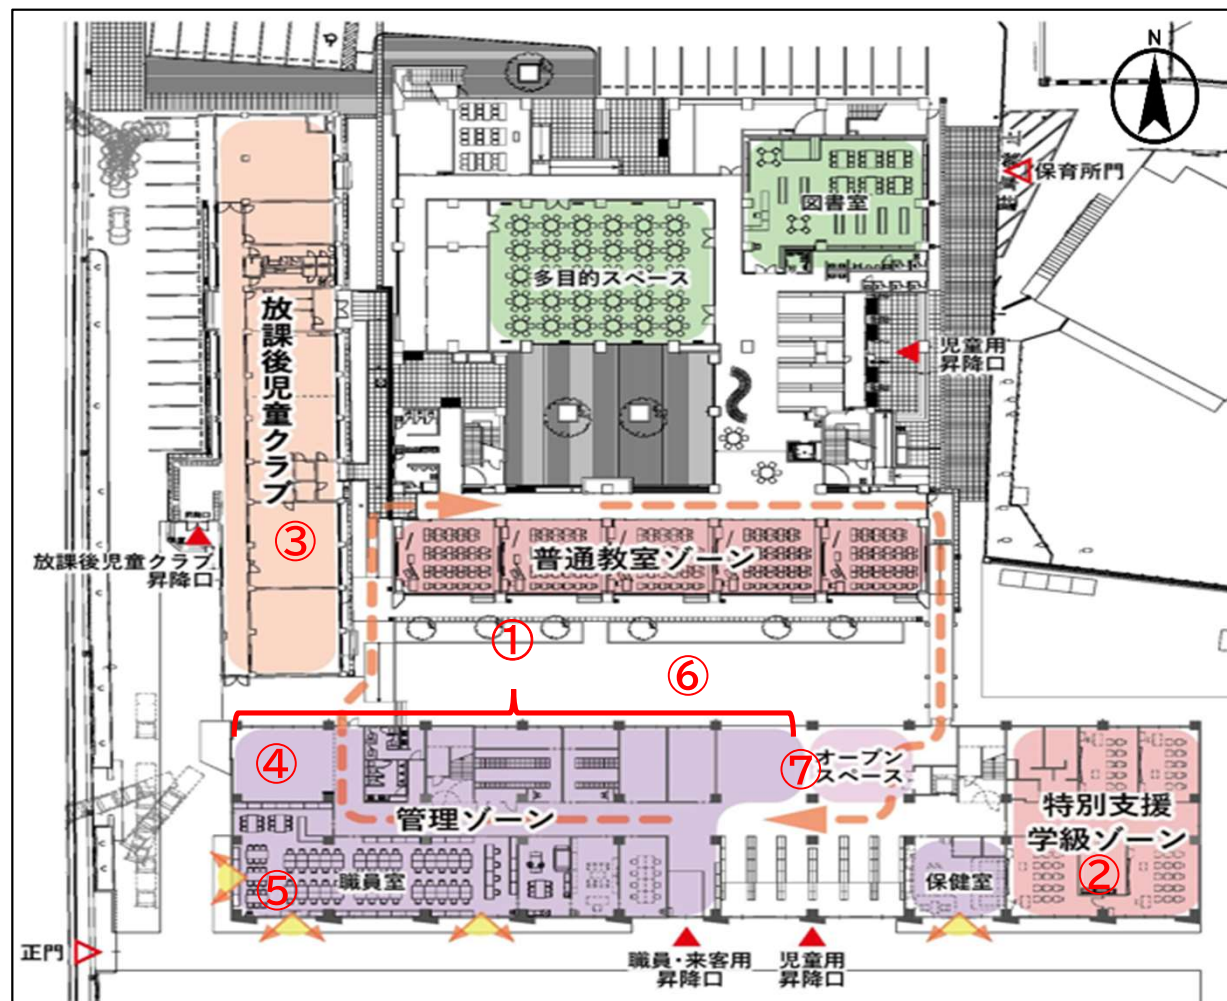

3) 計画概要

平面計画 <2F>


- ① 南側に普通教室、東側に特別支援学級ゾーンを明確に分けて配置。
- ② 屋外渡り廊下により既存校舎と接続、棟間の移動をスムーズに。
- ③ 管理教室棟は、コンピューター教室・放送室を図工室に改修し、家庭科室と合わせて特別教室ゾーンを形成。
- ④ 管理教室棟北側は放課後児童クラブゾーンとし、管理扉にて区画する。
- ⑤ 1学年に対して1カ所トイレを設置。
- ⑥ 各階・各校舎からアクセスしやすい位置にラーニング commons を設置。

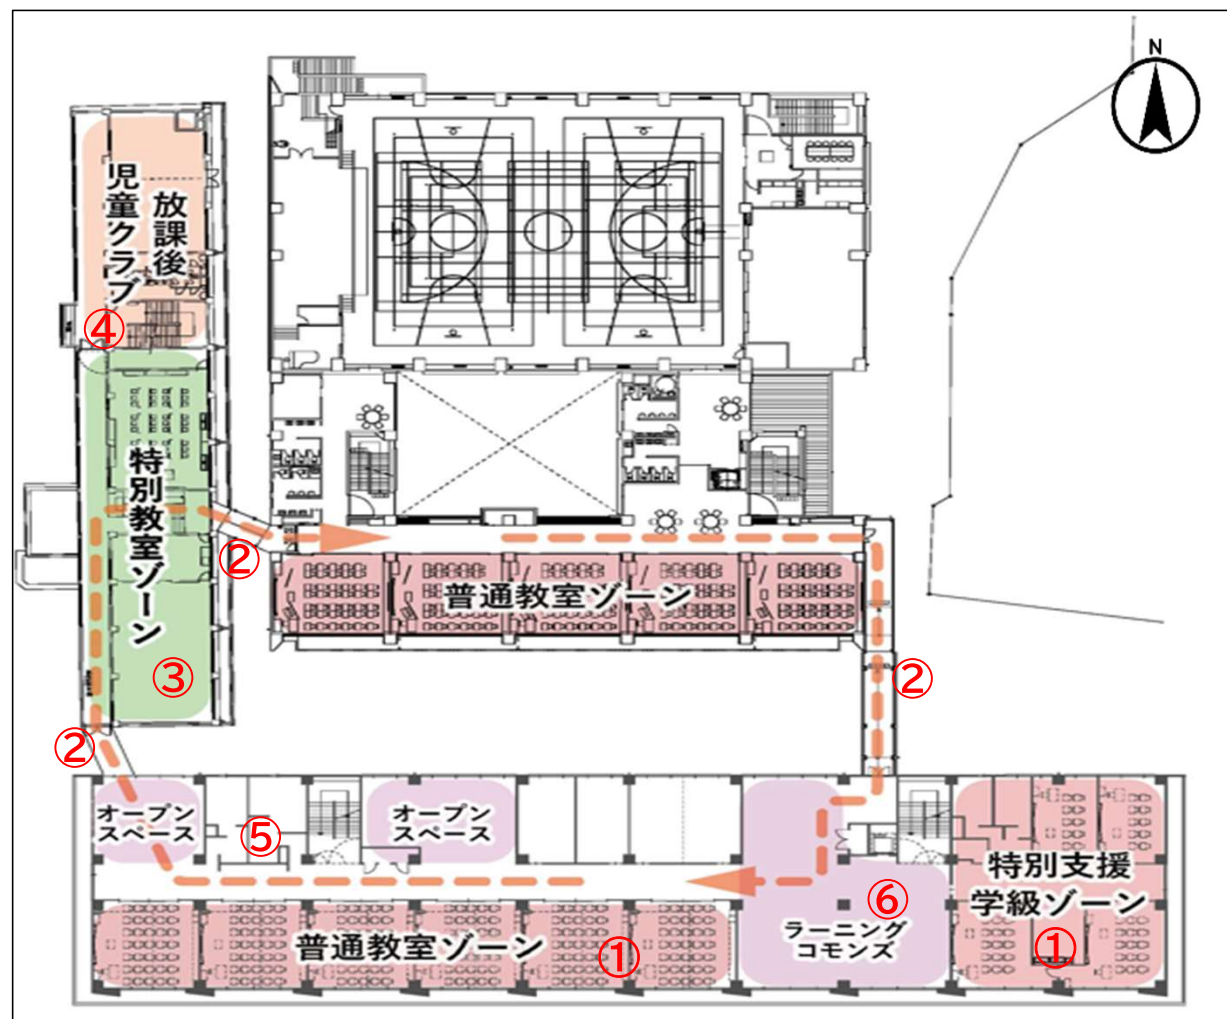

3) 計画概要

平面計画 < 3 F >


- ① 南側に普通教室を配置し、オープンスペースや少人数教室と連携した利用ができる学年ユニットを形成し、多様な学習形態に対応できる計画とする。
- ② 避難器具を設置(3F・4F)。
- ③ 多目的室は1学年6クラス編成時に普通教室として転用可能。

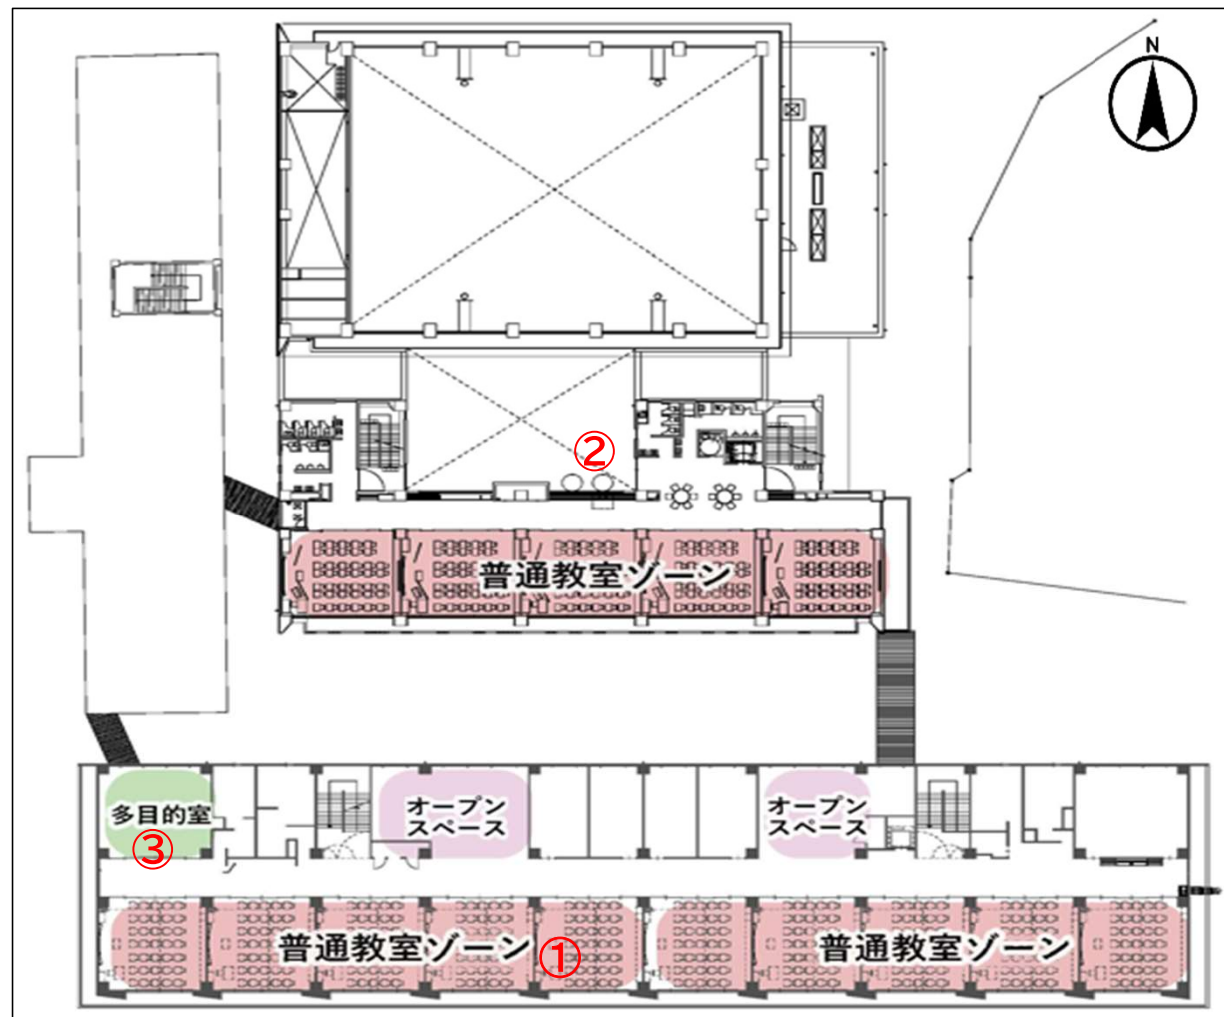

3) 計画概要


外構計画

- ① 建物内へのアプローチはバリアフリーでの計画とする。
- ② 中庭はウッドデッキとし、上足で利用可能。
- ③ 敷地西側に正門と車両出入口用の校門を新設。
- ④ 受水槽は極力敷地内側へ寄せ、鳥居門付近の見通しを確保。
- ⑤ 受水槽付近は学級園・花壇スペースとして利用できる計画。
- ⑥ 既存樹木は最低限の撤去・剪定とし緑の潤い溢れた屋外環境へ。
- ⑦ 敷地西側の防球ネットやフェンスの撤去を最小限に抑える。

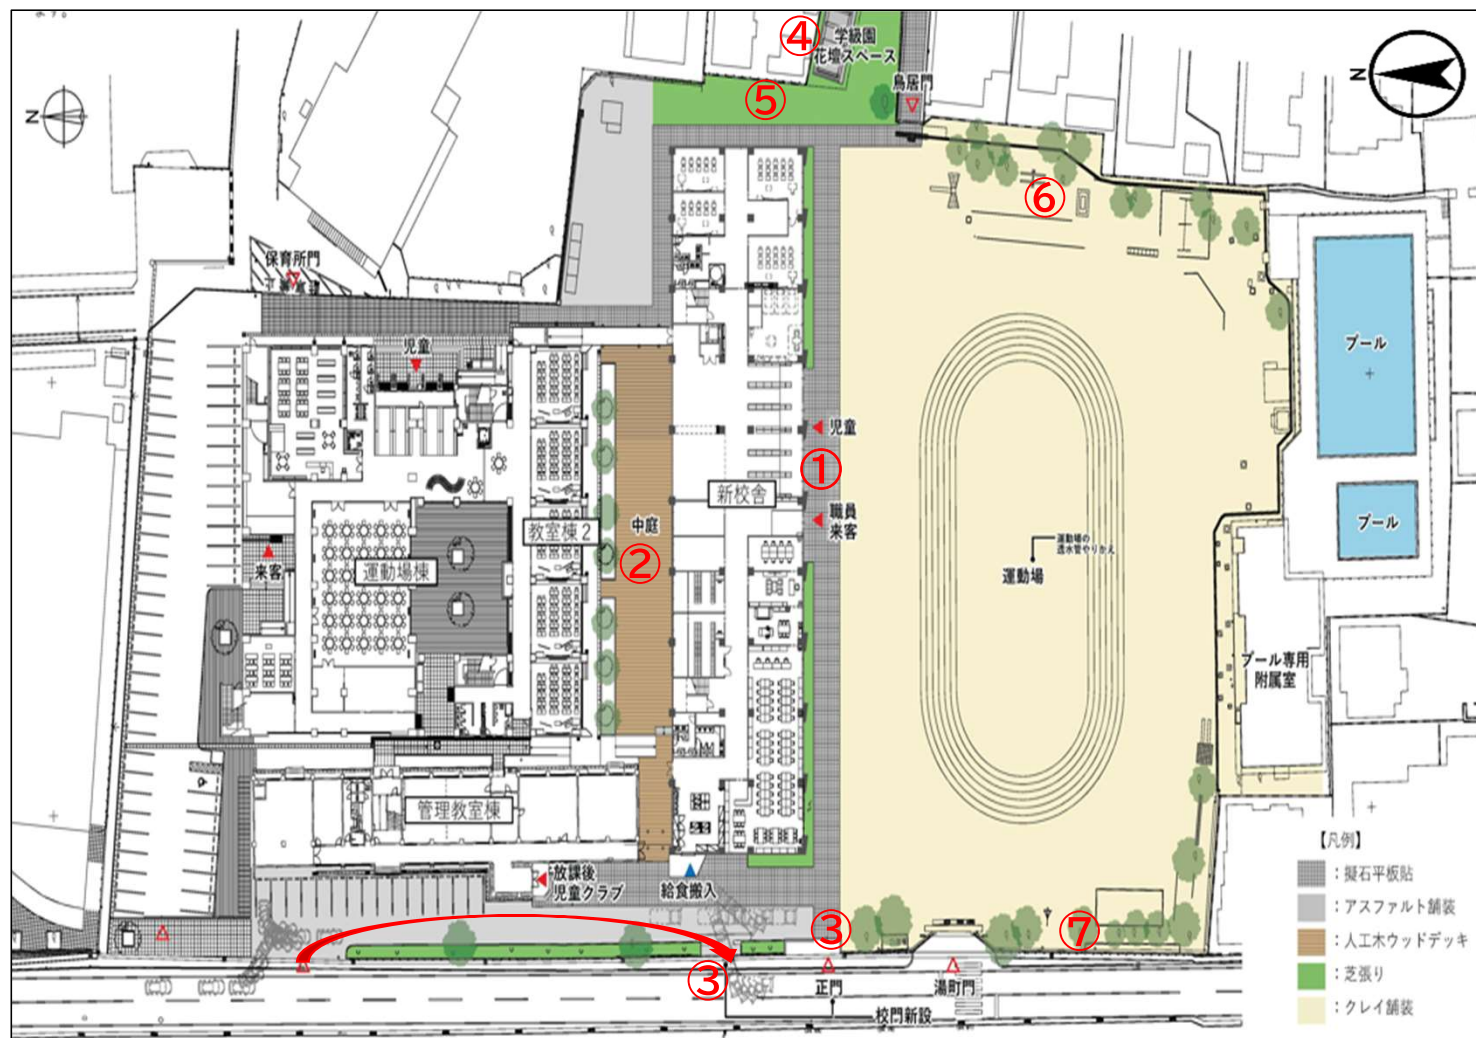

4) スケジュール・工事工程

【全体スケジュール】

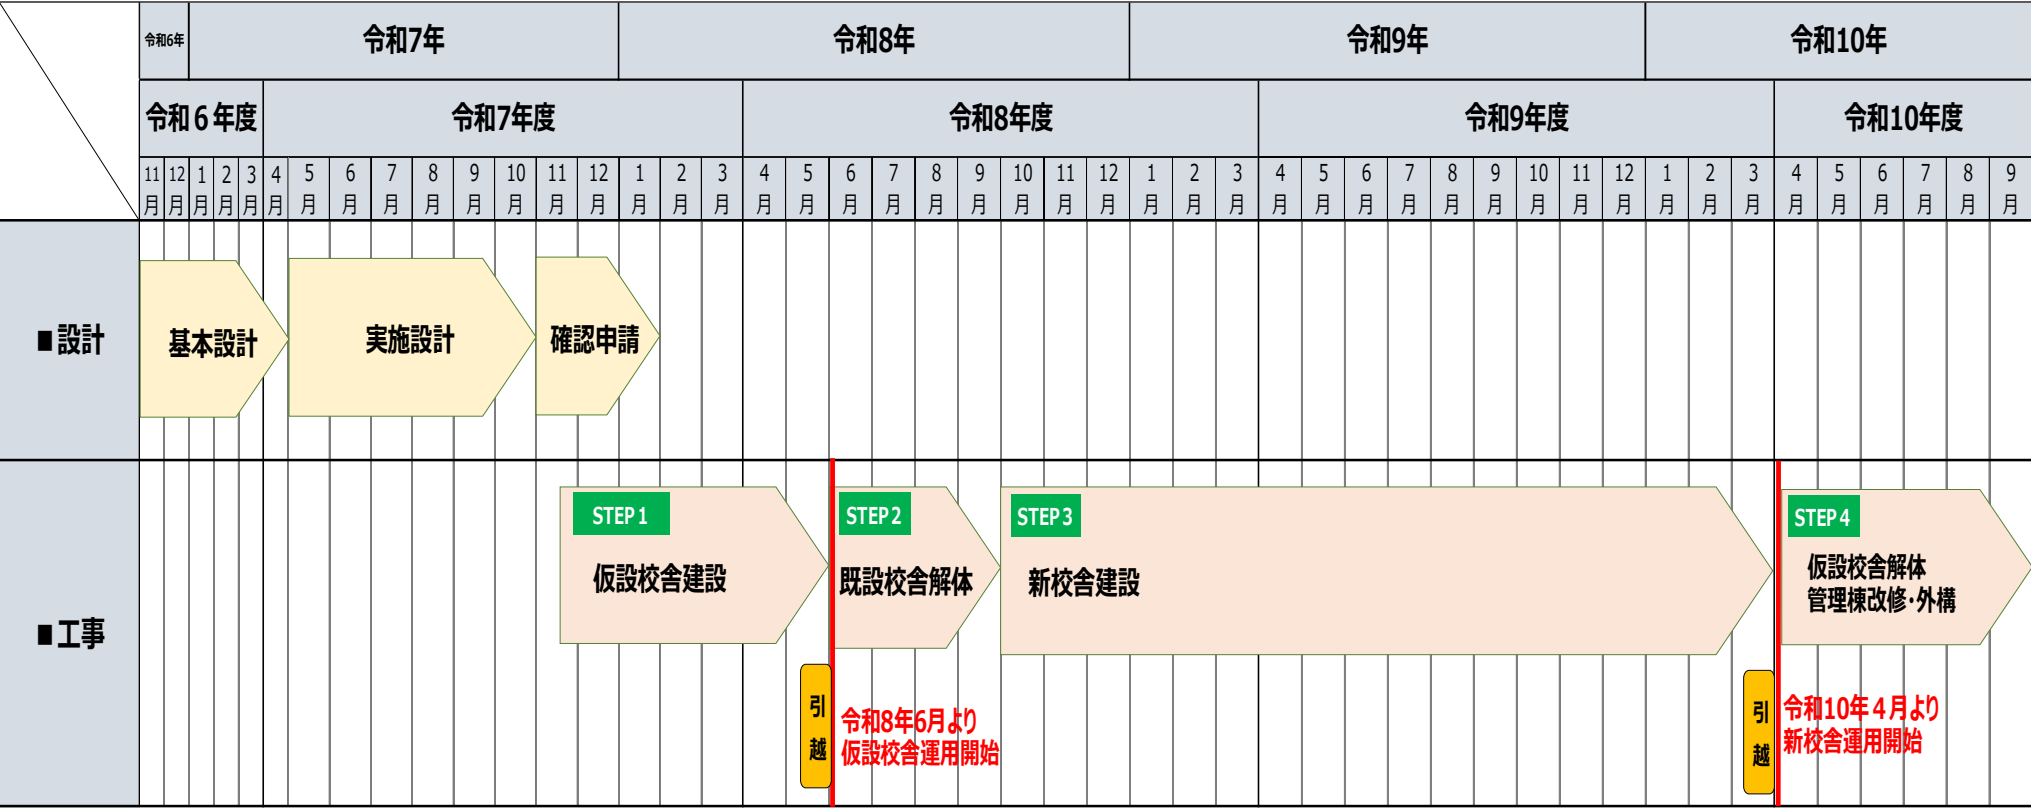

- 全体の工期：令和7年11月中旬～令和10年9月
- 仮設校舎建設の開始は学校および地域の運動会開催後を予定。


4) スケジュール・工事工程

	令和7年						令和8年												令和9年												令和10年											
	令和7年度						令和8年度												令和9年度												令和10年度											
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月			
■工事																																										

STEP 1 仮設校舎建設

【期間：令和7年11月中旬～令和8年5月】

- 教室棟1の建替え工事期間中は、運動場に仮設校舎を建設し、教室棟2と渡り廊下で接続します。
- 受水槽の移設を行います。また、工事の支障となる樹木の伐採、遊具の撤去を行います。
 - ⇒ 樹木：学級札などに活用予定。
 - ⇒ 遊具：外構工事で新設を検討。

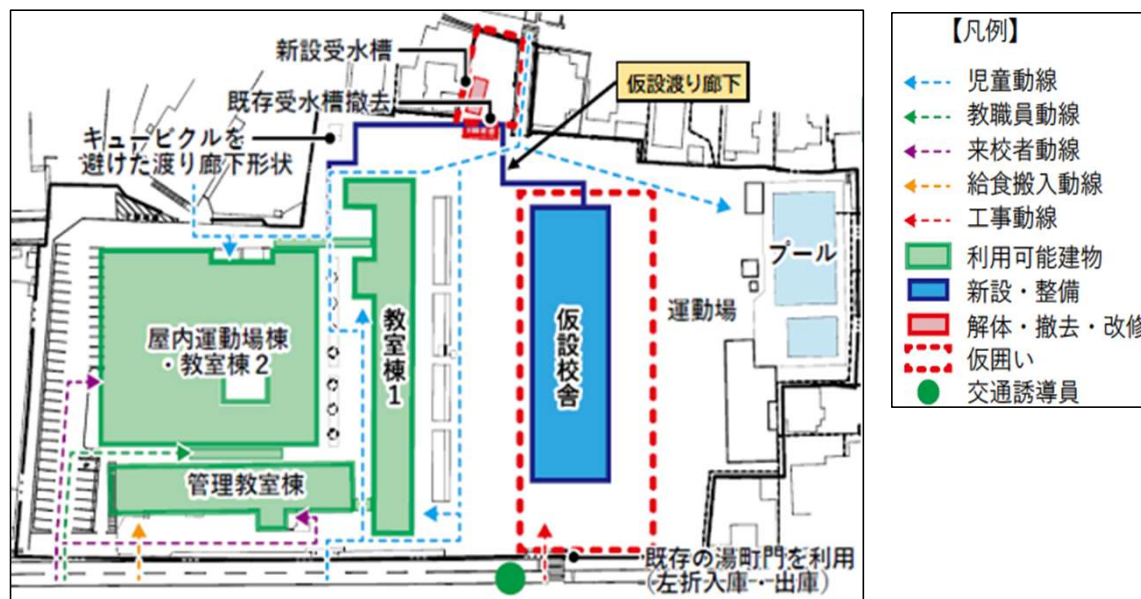


4) スケジュール・工事工程

[illegible]

STEP 2 既設校舎解体

【期間：令和8年6月～令和8年9月】

- 教室棟1の解体を行います。
(騒音等の発生を想定し、夏休みに
工事期間を組み入れております。)
- 既設校舎解体及び新校舎建設の期間
中は、仮設の渡り廊下にて移動して
いただきます。

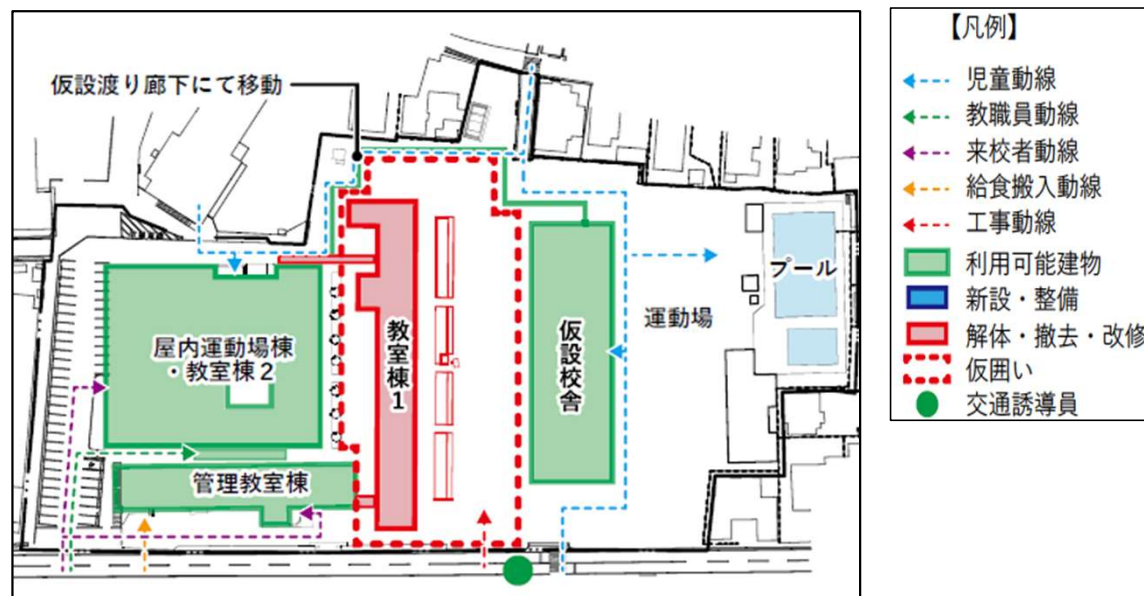


4) スケジュール・工事工程

	令和7年						令和8年						令和9年						令和10年																				
	令和7年度						令和8年度						令和9年度						令和10年度																				
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
■工事																																							
																																						</	

STEP 3 新校舍建設

【期間：令和8年10月～令和10年3月】

- 教室棟1の解体跡地に新校舎を建設します。
- 新校舎の屋上にキュービクルを新設します。

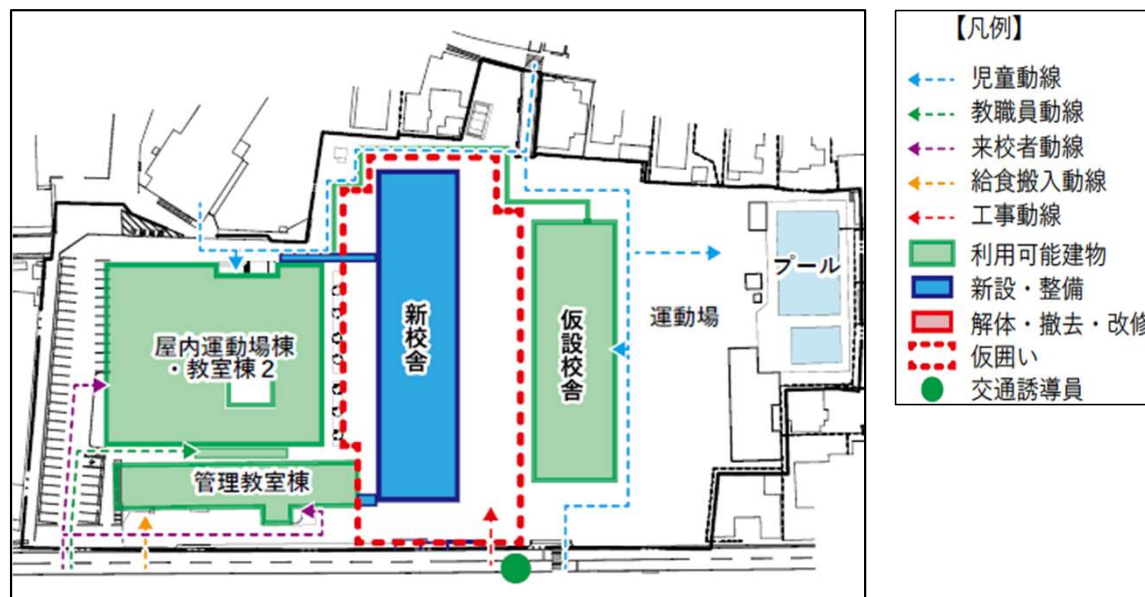

4) スケジュール・工事工程


	令和7年			令和8年												令和9年												令和10年										
	令和7年度						令和8年度												令和9年度												令和10年度							
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
■工事							STEP 1 仮設校舎建設						STEP 2 既設校舎解体						STEP 3 新校舎建設												STEP 4 仮設校舎解体 管理棟改修・外構							

STEP4

仮設校舎解体
管理棟改修・外構

【期間：令和10年4月～令和10年9月】

- 仮設校舎及び渡り廊下の解体工事、管理教室棟の改修工事、グラウンドの整地を含めた外構工事等を行います。

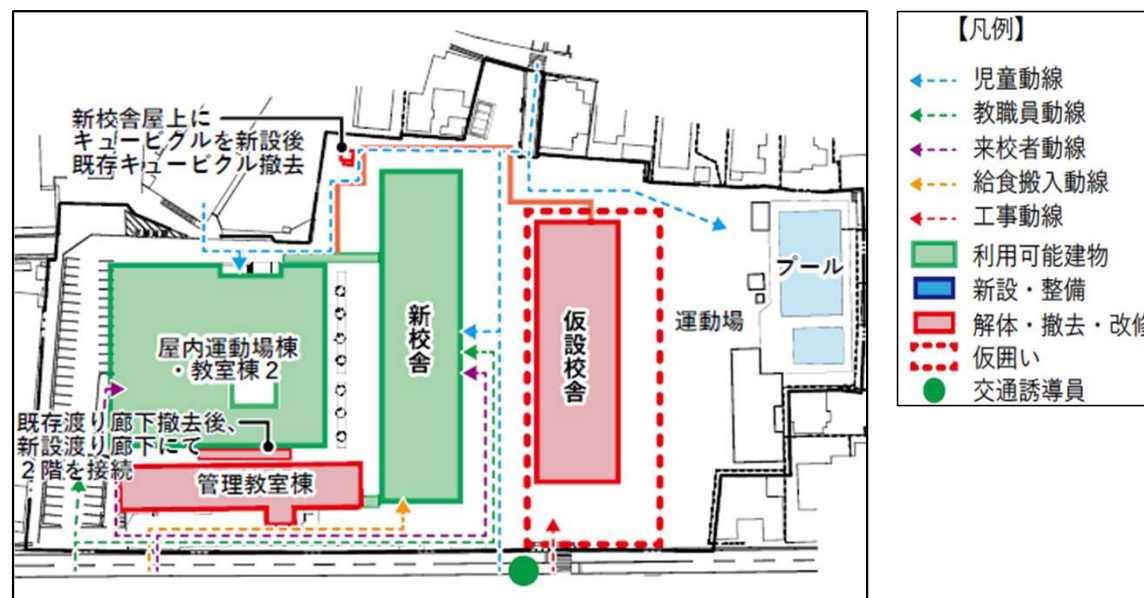

5) その他

○今後のお知らせについて

◆保護者さま向け

校舎増改築だよりの配信(アプリ)

◆地域住民さま向け

隣組回覧や工事チラシの配布

◆市ホームページ、「広報ちくしの」への掲載

○保護者・地域住民の皆様へ

今後、各工事の開始前には安全対策や皆様へのお願い事項など、改めてお知らせさせていただきます。
工期が長期間にわたりますので、保護者・地域住民・児童の皆様にはご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、
何卒、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

ご清聴ありがとうございました。

